**AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE MONTALBAN**
Plaza Cristo de La Luz, 1
San Martín de Montalbán (45.165) Toledo
Alcaldía

Asunto: **Comunicación** corte de carretera para rehabilitación del firme.
Carretera: TO-3845 pk 0+000 a 6+650, término de San Martín de Montalbán (TO).
Promotora: Cemex España

Toledo, a 1 de julio de 2021.

Para la ejecución de la REHABILITACION DE FIRME en la carretera TO-3845 Pk 6+650 MD (antigua TO-7428) dentro del término municipal de San Martin de Montalbán (TOLEDO), el sistema elegido consiste en RECICLADO IN SITU EN FRÍO CON CEMENTO, por lo que se considera necesario el corte selectivo del tramo de carretera donde se actúa (pk 0+000 a 6+650) y se aporta el siguiente itinerario alternativo por carreteras de titularidad autonómica.

En los puntos de corte de carretera, se materializará la prohibición al avance mediante la instalación de barreras tipo "New Jersey" junto con señalización de "CARRETERA CORTADA", además de la señalización convencional. En horario de trabajo habrá, en ambos puntos de corte, personal de obra para realizar los servicios de información y vigilancia de acceso al tramo de carretera afectado. Asimismo, se dispondrá señalización informativa del corte y desvíos, que ocasione los mínimos trastornos a los usuarios.

El plazo de ejecución de los trabajos será de seis a ocho semanas:

- ✓ Fecha de inicio del corte: 26/07/2021
- ✓ Fecha de finalización del corte: 10/09/2021.

Se adjunta croquis del itinerario alternativo propuesto.

Redactor del Proyecto
Director de Obra

Fdo: Luis Miguel Jumela Romero

1 - **ATENCION** carretera **TO-3845** CORTADA. DESVIO a San Martín de M. por **CM-401** y **CM-4009**.
2 - **ATENCION** carretera **TO-3845** CORTADA en **PK 7**. DESVIO a San Martín de M. por **CM-401**. Los Navalmorales - Navahermosa
3 - **ATENCION** carretera **TO-3845** CORTADA. DESVIO a Villarejo de M. por **CM-4009** y **CM-401**.
4 - **ATENCION** carretera **TO-3845** CORTADA. DESVIO a Villarejo de M. por **CM-401**.
5 - Carteles direccionales indicando los sentidos: Navahermosa - San Martín de M.
6 - **ATENCION** carretera **TO-3845** CORTADA en **PK 7**. DESVIO a San Martín de M. por **CM-401**. Los Navalmorales – Navahermosa

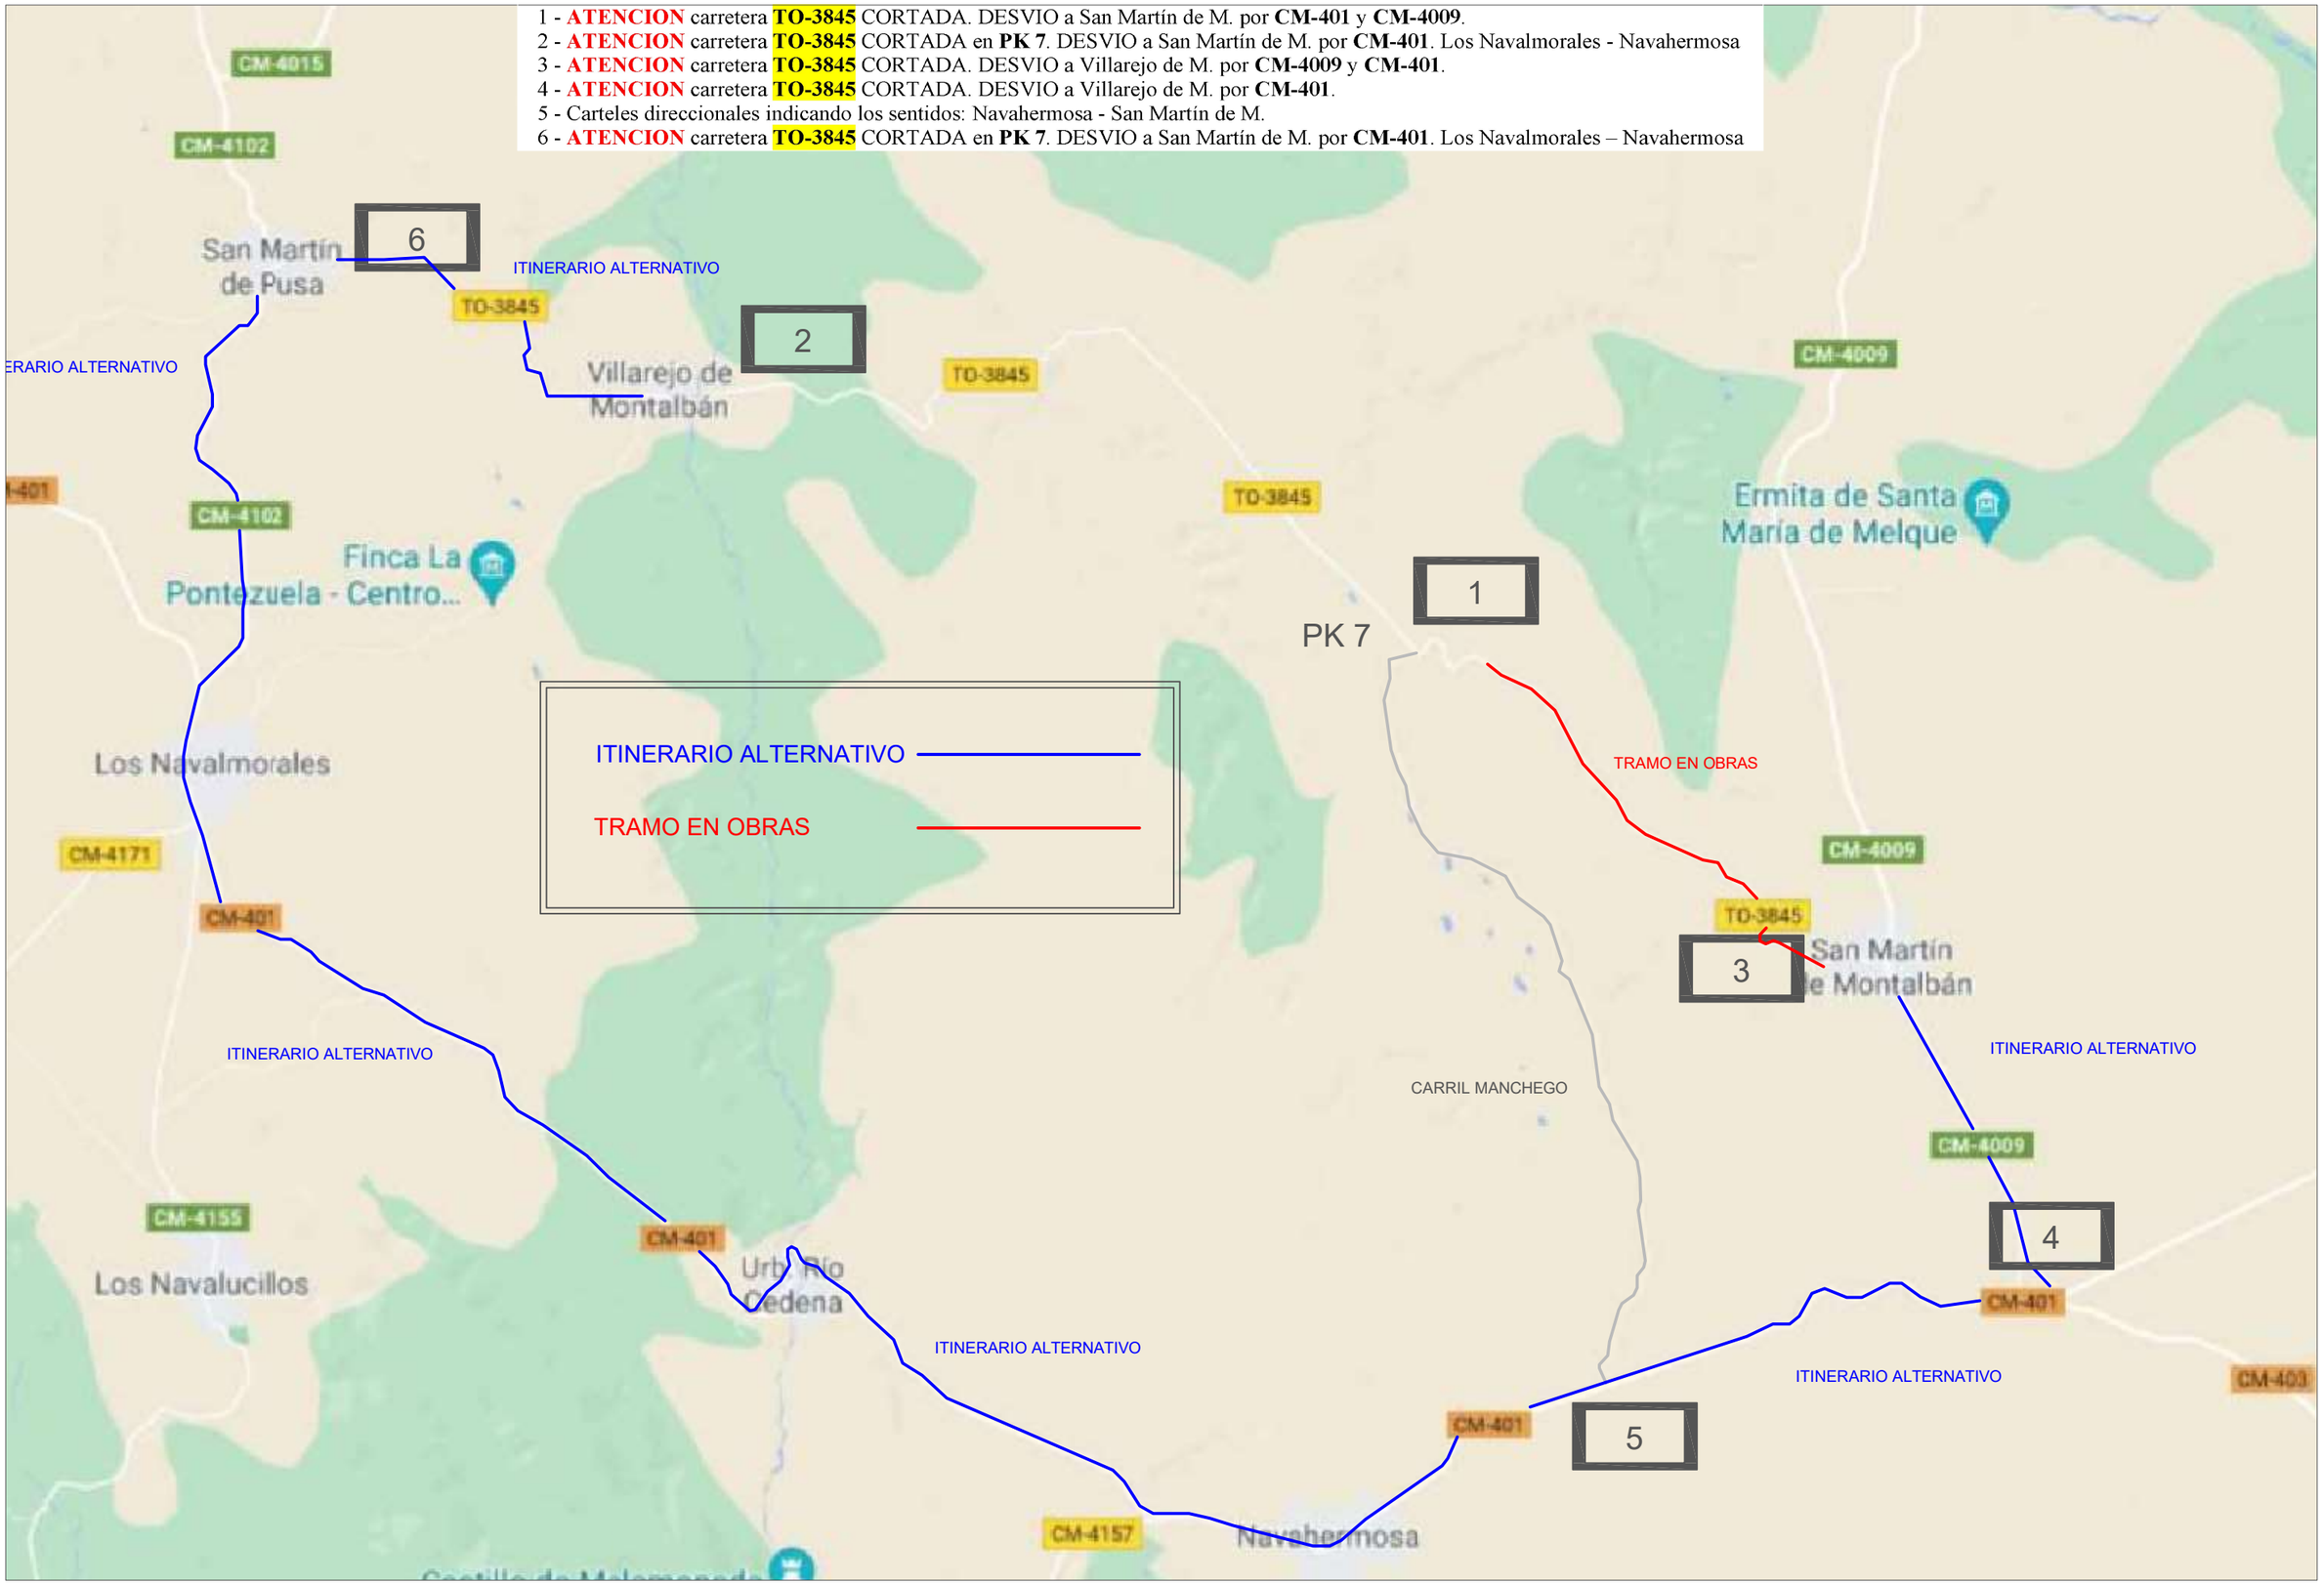


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMEX | DIPUTACIÓN DE TOLEDO | CONSULTORA: INGENIUS | AUTOR DEL PROYECTO: LUIS MIGUEL JUMELA ROMERO | PROPIEDAD: CEMEX ESPAÑA | ESCALA: indicadas | TÍTULO: **PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN** REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA TO-3845 EJECUCIÓN ACCESO PK 6+650 MD (SAN MARTÍN DE MONTALBÁN) | PLANO: **ITINERARIOS ALTERNATIVOS** SEÑALIZACIÓN CORTE DE CARRETERA | JUNIO 2021 |
| | | | | | | | | Nº PLANO: 1 / HOJA 1 DE 1 |
